Estudio camino de acceso a Las Viñas. Minas de Almagrera. Calañas (Huelva).

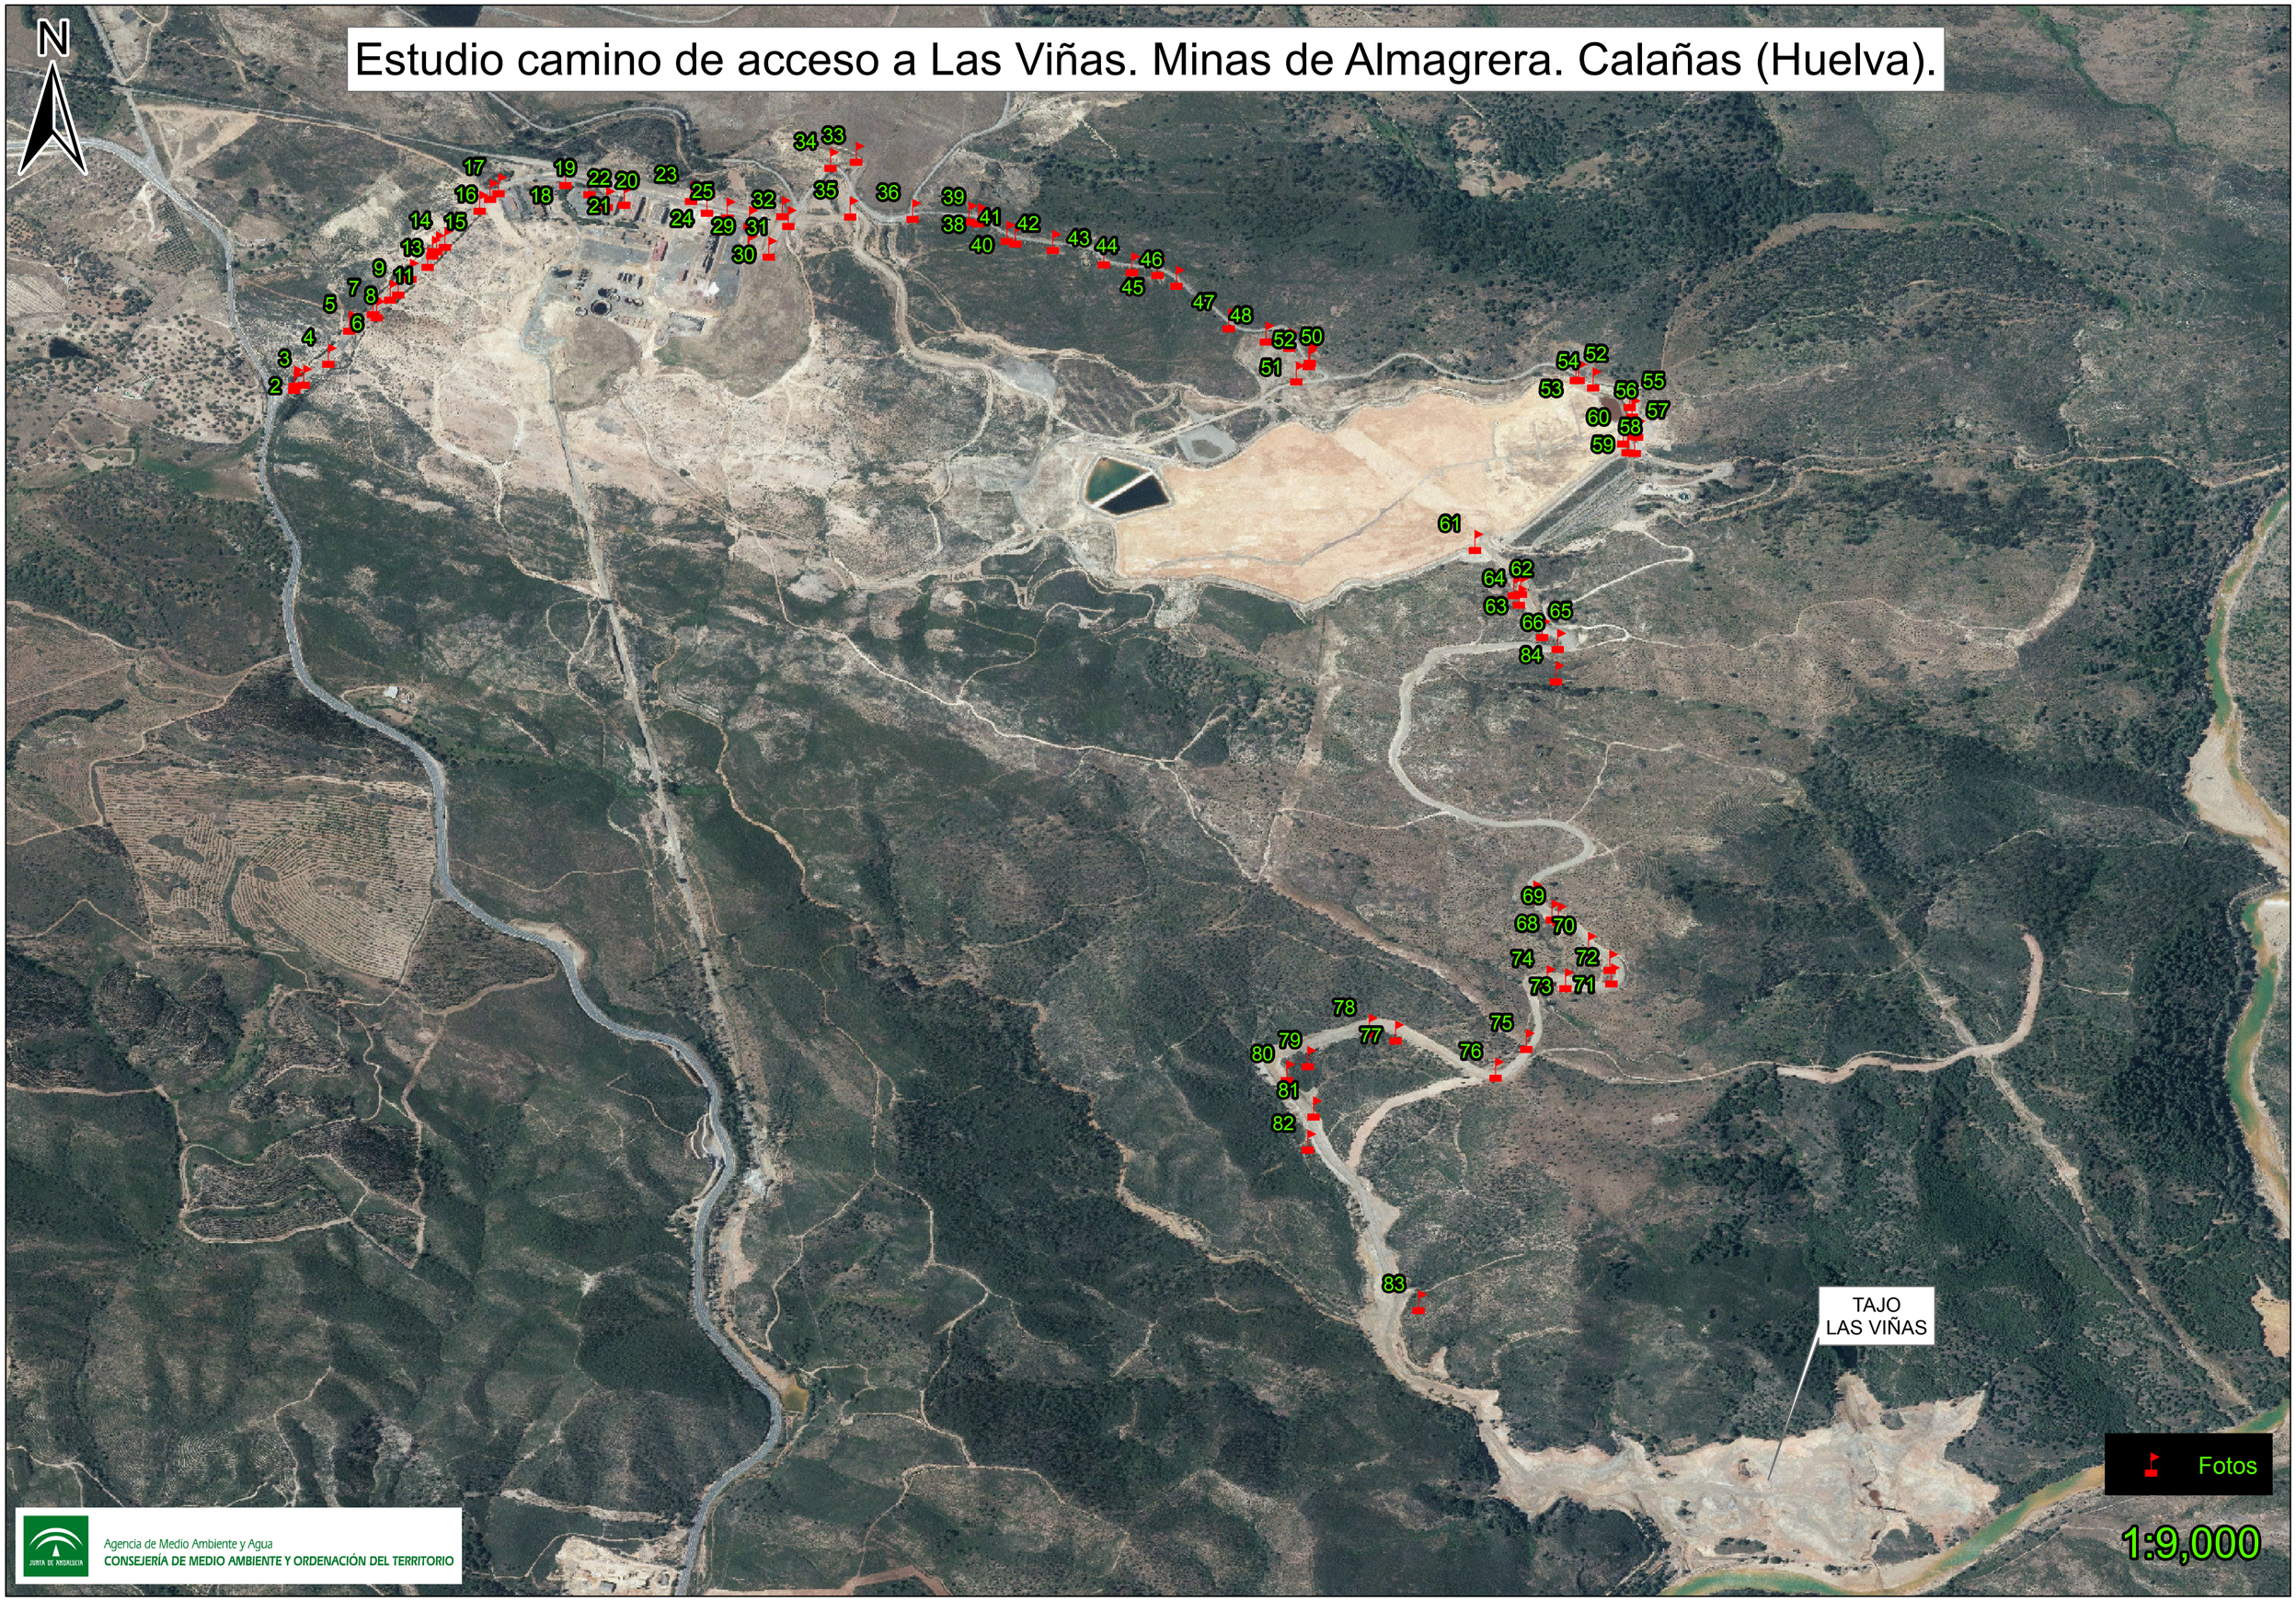

FOTO	N	W	DESCRIPCION FOTO	OBSERVACIONES
1	37 38 9,56	6 51 49,74	Asfaltos, baches 10 X 7	P.K. 0+000
2	37 38 9,87	6 51 49,71	Asfaltos, baches 10 X 7	
3	37 38 9,94	6 51 49,03	Asfaltos, baches 10 X 7	
4	37 38 11,46	6 51 47,25	Asfaltos, baches 10 X 7	
5	37 38 13,89	6 51 45,72	Asfaltos, baches 10 X 7	
6	37 38 14,88	6 51 43,72	Asfaltos, baches 10 X 7	P.K. 0+600
7	37 38 15,09	6 51 43,98	Asfaltos, baches 20 X 7	
8	37 38 16,16	6 51 42,73	Asfaltos, baches 10 X 7	
9	37 38 16,53	6 51 42,13	Asfaltos, baches 10 X 7	
10	37 38 17,65	6 51 41,24	Asfaltos, baches 10 X 7	
11	37 38 18,54	6 51 39,99	Asfaltos, baches 10 X 7	
12	37 38 19,36	6 51 39,63	Asfaltos, baches 10 X 7	
13	37 38 19,68	6 51 39,34	Asfaltos, baches 10 X 7	
14	37 38 20,01	6 51 38,73	Asfaltos, baches 10 X 7	
15	37 38 22,64	6 51 36,19	Asfaltos, baches 10 X 7	P.K. 0+500
16	37 38 23,50	6 51 35,41	Asfaltos, baches 10 X 7	
17	37 38 23,93	6 51 34,81	Asfaltos, baches 10 X 7	
18	37 38 24,52	6 51 29,93	Asfaltos, baches 20 X 7	
19	37 38 23,85	6 51 28,17	Asfaltos, baches 10 X 7	
20	37 38 22,92	6 51 26,92	Asfaltos, baches 10 X 7	
21	37 38 23,08	6 51 25,62	Asfaltos, baches 10 X 7	
22	37 38 23,08	6 51 25,62	Asfaltos, baches 10 X 7	
23	37 38 23,35	6 51 20,75	Asfaltos, baches 10 X 7	
24	37 38 22,50	6 51 19,59	Asfaltos, baches 10 X 7	
25	37 38 22,15	6 51 18,11	Asfaltos, baches 10 X 7	P.K. 1+000
26	37 38 21,52	6 51 16,47	Asfaltos, baches 10 X 7	
27	37 38 21,52	6 51 16,47	Asfaltos, baches 10 X 7	Cadena
28	37 38 19,65	6 51 16,51	Asfaltos, baches 10 X 7	
29	37 38 19,58	6 51 16,57	Asfaltos, baches 10 X 7	
30	37 38 19,28	6 51 15,07	Asfaltos, baches 20 X 7	
31	37 38 22,24	6 51 14,08	Asfaltos, baches 10 X 7	
32	37 38 21,54	6 51 13,64	Asfaltos, baches 10 X 7	
33	37 38 26,21	6 51 8,68	Asfaltos, baches 10 X 7	
34	37 38 25,77	6 51 10,55	Asfaltos, baches 10 X 7	
35	37 38 22,23	6 51 9,11	Asfaltos, baches 10 X 7	
36	37 38 22,04	6 51 4,55	Asfaltos, baches 20 X 7	Cruce generador
37	37 38 21,85	6 51 0,43	Asfaltos, baches 10 X 7	P.K. 1+600
38	37 38 21,72	6 50 59,74	Asfaltos, baches 10 X 7	
39	37 38 21,72	6 50 59,74	Asfaltos, baches 10 X 7	
40	37 38 20,45	6 50 57,67	Asfaltos, baches 10 X 7	
41	37 38 20,25	6 50 57,06	Asfaltos, baches 10 X 7	
42	37 38 19,78	6 50 54,31	Asfaltos, baches 10 X 7	
43	37 38 18,72	6 50 50,59	Asfaltos, baches 10 X 7	P.K. 2+000
44	37 38 18,14	6 50 48,55	Asfaltos, baches 10 X 7	
45	37 38 17,96	6 50 46,67	Asfaltos, baches 10 X 7	
46	37 38 17,16	6 50 45,29	Asfaltos, baches 10 X 7	
47	37 38 14,05	6 5041,46	Asfaltos, baches 10 X 7	
48	37 38 13,08	6 50 38,76	Asfaltos, baches 10 X 7	
49	37 38 12,62	6 50 37,06	Asfaltos, baches 10 X 7	Incluye limpieza de caño y cuneta.
50	37 38 11,55	6 50 35,55	Asfaltos, baches 10 X 7	
51	37 38 10,18	6 50 36,53	Asfaltos, baches 20 X 7	Cruce planta nueva P.K. 2+450
52	37 38 11,28	6 50 35,62	Asfaltos, baches 10 X 7	
52	37 38 10,28	6 50 15,91	Asfaltos, baches 10 X 7	
53	37 38 10,27	6 50 16,11	Asfaltos, baches 10 X 7	
54	37 38 9,73	6 50 14,85	Asfaltos, baches 10 X 7	
55	37 38 8,31	6 50 12,18	Asfaltos, baches 10 X 7	
56	37 38 7,61	6 50 12,00	Asfaltos, baches 10 X 7	
57	37 38 6,13	6 50 11,64	Asfaltos, baches 10 X 7	Fin asfalto P.K. 3+100
58	37 38 4,95	6 50 11,80	1º curva C.G.M Tacon del dique	Dar anchura curva pozo 27 suministro zahorra ZA-25 10 m3 aprox.
59	37 38 4,99	6 50 12,34		Paquete firme zahorra ZA-25 5X0,30X450 m (+7 pasos)
60	37 38 5,65	6 50 12,65		
61	37 37 57,88	6 50 23,47		
62	37 37 54,56	6 50 20,65	Farallon tubo PEAD 900	
63	37 37 54,67	6 50 20,12	Carcavas + cunetas	
64	37 37 53,88	6 50 20,26	Carcavas + cunetas	
65	37 37 51,50	6 50 18,58		Curva
66	37 37 50,65	6 50 17,44		
67	37 37 32,26	6 50 19,18		
68	37 37 30,87	6 50 17,86		
69	37 37 30,69	6 50 17,38		
70	37 37 28,52	6 50 15,18		
71	37 37 27,21	6 50 13,64	Curva carcavas	
72	37 37 26,22	6 50 13,50		
73	37 37 25,88	6 50 16,86		Carcavas + paso limpieza
74	37 37 26,09	6 50 18,20		
75	37 37 21,44	6 50 19,73		
76	37 37 19,33	6 50 21,97		
77	37 37 22,05	6 50 29,27		
78	37 37 22,53	6 50 31,21		
79	37 37 20,17	6 50 35,69		
80	37 37 19,17	6 50 37,21		
81	37 37 16,49	6 50 35,28	Aporte de escolleras	
82	37 37 14,07	6 50 35,68		
83	37 37 2,37	6 50 27,59		
84	37 36 48,27	6 50 17,56		
85	38 36 49,09	6 50 12,21	Salto agua carcavas	P.K. 4+900
86	39 36 48,56	6 50 10,57	Marco de paso	2mX10mX5m (2 salidas)
87	40 36 48,34	6 50 3,91		Tajo fin de camino de acceso

BAJADA DEPURADORA VIEJA

FOTO	N	W	DESCRIPCION FOTO	OBSERVACIONES			
1	37 38 4,54	6 50 17,39	Asfaltos, baches 10 X 5	P.K. 0+000	10	5	50
2	37 38 3,65	6 50 9,82	Asfaltos, baches 10 X 5	P.K. 0+030	10	5	50

3	37 38 3,34	6 50 8,05	Asfaltos, baches 30 X 3	P.K. 0+100 (Entre el canal y asfalto antiguo)	30	5	150
4	37 38 3,40	6 50 7,04	Asfaltos, baches 10 X 5		10	5	50
5	37 38 3,43	6 50 5,62	Asfaltos, baches 10 X 5		10	5	50
6	37 38 3,52	6 50 5,40	Asfaltos, baches 3 X 3		3	3	9
7	37 38 2,71	6 50 5,98	Asfaltos, baches 30 X 4		30	4	120
8	37 38 2,07	6 50 10,21	Asfaltos, baches 10 X 5	P.K. 0+300	10	5	50
							529

BAJADA DEPURADORA NUEVA

FOTO	N	W	DESCRIPCION FOTO	OBSERVACIONES			
1	37 38 9,70	6 50 34,02	Asfaltos, baches 35 X 6	P.K. 0+000	35	6	210
2	37 38 9,81	6 50 35,65	Asfaltos, baches 20 X 6		20	6	120
3	37 38 9,70	6 50 35,65	Asfaltos, baches 10 X 6		10	6	60
4	37 38 9,18	6 50 38,09	Asfaltos, baches 10 X 6	P.K. 0+100	10	6	60
5	37 38 9,01	6 50 38,30	Asfaltos, baches 10 X 6		10	6	60
6	37 38 8,25	6 50 39,55	Asfaltos, baches 10 X 6		10	6	60
7	37 38 7,86	6 50 40,30	Asfaltos, baches 10 X 6		10	6	60
8	37 38 8,21	6 50 39,40	Asfaltos, baches 10 X 6	P.K. 0+200	10	6	60
9	37 38 6,54	6 50 44,97	Asfaltos, baches 10 X 6		10	6	60
10	37 38 6,08	6 50 45,60	Asfaltos, baches 10 X 6		10	6	60
11	37 38 6,11	6 50 45,55	Asfaltos, baches 20 X 6		10	6	60
12	37 38 5,16	6 50 48,18	Asfaltos nuevo hasta el pozo (24) 50 X 6	P.K. 0+500	20	6	120
							990
